广西贵港市港南区木梓镇南深高铁南玉段外部加固屋顶彩钢瓦棚工程“5.24”非生产安全事故调查

2024-07-23 17:50　来源：港南区应急管理局

2024年5月24日16时40分许，位于港南区木梓镇木梓村山田屯127号发生一起屋顶彩钢瓦棚加固作业触电事故造成一名工人死亡.依照《中华人安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，并根据港南区人民政府办公室《港南区人民政府关于成立广西贵港市港镇南深高铁南玉段外部加固屋顶彩钢瓦棚工程“5.24”触电一般事故调查组的通知》要求(以下简称“5.24”事故)，由港南区应急局、港南公安分社局、区总工会、区住建局、木梓镇人民政府、木梓派出所等部门和单位抽调人员组成了调查组。事故调查组下设技术组、管理组和综合组，调查“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，开展对“5.24”事故进行调查。经过事故现场勘查、取证核实等工作，查明事故发生的原调查情况报告如下:

一、事故基本情况

(一)工程概况

南玉铁路项目已接近尾声，准备进入试通车阶段。根据广西南玉铁路有限公司、贵港市公路事业发展中心、南玉铁路(港南段)指挥部、港南区门的要求，为做好南玉铁路(港南段)开通前外部环境安全隐患整治工作，2024年1月6日木梓镇政府将辖区内南玉铁路沿线(500米范围内)需要房屋的装修工程承包给朱某某。合同的主要内容:由朱某某以包工包料的方式，以每平方米35元，加固或拆除木梓镇政府指定的农户屋顶彩钢瓦棚或铁固方案和材料标准由木梓镇政府提供。后朱某某以口头约定的方式将屋顶彩钢瓦棚等加固工程分包给梁某宁，梁某某又以包工不包料的方式承包给徐某焱、徐某锋三人。在施工过程中徐某杰等三人叫来同村人徐某捷做杂工。朱某某、梁某某均以自然人的身份承包或分包上述工程。

二、事故发生经过和事故救援情况


2024年5月24日徐某杰、徐某焱、徐某锋、徐某捷四人在木梓镇木梓村山田屯127号一农户家进行加固屋顶彩钢瓦棚作业。

作业内容为:沿檩条方向增加压条，并且用不锈钢燕尾自攻螺钉加固，在屋面上用钢丝绳张拉加固。

但现场作业的四个工人没有认真观察位于二楼天花板电线的布线情况，致使一根自攻螺钉穿过电线，造成屋顶彩钢瓦漏电。16时40分许，徐某楼，拉紧从二楼彩钢瓦垂下的钢丝绳准备加固，身体触碰到门口铁护栏形成短路触电，倒地不起。徐某杰见状马上赶过去抢救，并拨打120求救。后木梓镇卫生院医护人员到达现场急救，徐某捷经抢救无效死亡。

木梓镇政府和公安机关接报后也派人到现场处置。

三、事故发生现场图片

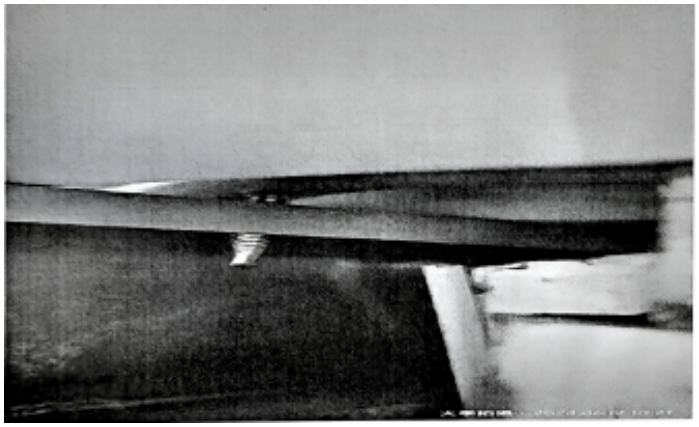

(一根不锈钢燕尾自攻螺钉穿过二楼天花板的电线，造成屋顶彩钢瓦漏电)



(徐思捷站在一楼牵拉从二楼彩钢瓦垂下的钢丝绳，身体触碰到门口铁护栏形成短路触电)

四、事故发生的原因

(一)直接原因

在加固二楼屋顶彩钢瓦棚作业时，一根自攻螺丝钉穿过天花板的电线，造成屋顶彩钢瓦漏电，徐某捷牵拉钢丝绳时触碰到门口铁护栏形成短亡。

(二)间接原因

徐某杰等四人在作业时，对屋内的电线布线情况没有认真观察，疏忽大意导致自攻螺丝钉穿过电线漏电。

五、事故性质分析

《中华人民共和国安全生产法》第二条规定“在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位(以下统称生产经营单位)的安全生产，适用本该法第二条中的使用主体范围并不包含自然人，综上所述，朱某某、梁某某均以自然人的身份承包和分包屋顶彩钢瓦棚加固工程，对徐某捷触电死不适用《中华人民共和国安全生产法》的主体范围。该事故不属于生产安全事故。

广西贵港市港南区木梓镇南深高铁南玉段

外部加固屋顶彩钢瓦棚工程“5.24”

事故调查组

2024年7月20日

主办：广西贵港市港南区人民政府　承办单位：港南区大数据发展和政务局

桂公网安备 45080302000124　桂ICP备14006736号-1　网站标识码 ： 4508030001
