湖北天恩润祥建筑工程有限公司
“5·9”一般高处坠落事故调查报告

2022年5月9日上午8时左右，沙市区朝阳街道中建·荆州之星二期乾盛地块项目发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失193万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖北省人民政府令第354号）和《荆州市沙市区人民政府办公室关于授权沙市区应急管理局组织 事故调查处理的通知》（沙政函〔2019〕19号）的规定，5月10日，区政府成立由区应急管理局牵头，区纪委监委、区公安分局、区总工会、区住建局、朝阳街办组成的湖北天恩润祥建筑工程有限公司“5·9”事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、询问有关人员，经专家组技术鉴定，综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对事故相关责任单位、责任人员的处理意见及事故防范措施和整改建议。现将事故调查处理情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

湖北天恩润祥建筑工程有限公司（以下简称“天恩润

祥”），成立于2017年8月15日，注册资本为贰仟零陆拾万圆整，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），单位住所地为武汉市汉阳区井岗村50号原物管中心用房归元装饰材料市场5-030号，法定代表人为柯昌贵，经营范围为建筑工程、装饰工程、市政工程、地基与基础工程、环保工程、消防工程、防水工程、防腐工程、保温工程、幕墙工程、楼宇智能化工程、公路工程、道路工程、照明工程、古建筑工程设计、施工；钢结构、机电设备、模板、脚手架、门窗安装；为建筑工程提供劳务服务（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）。有效期限至2037年8月14日，统一社会信用代码：91420105MA****8TXW，登记机关：武汉市汉阳区行政审批局，最近更新登记日期为2021年4月15日。

湖北天恩润祥建筑工程有限公司持有建筑业企业资质证书，资质类别及等级：钢结构工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级，证书编号：D3****7810，最近更新日期为2021年5月31日，有效期至2022年12月21日，发证机关为武汉市城乡建设局。

湖北天恩润祥建筑工程有限公司持有安全生产许可证，许可范围：建筑施工，证书编号：（鄂）JZ安许证字【2018】****05，最近更新日期为2021年7月16日，发证机关为湖北省住房和城乡建设厅。

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位基本情况

中建三局盛世荆州房地产开发有限公司（以下简称“盛世荆州”），成立于2019年6月6日，注册资本为壹亿圆整，类型为其他有限责任公司，单位住所地为湖北省荆州市沙市区碧波路32号4栋2-4层，法定代表人为邬欢，经营范围为房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），一般项目：非居住房地产租赁；房地产经纪；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。营业期限为长期，统一社会信用代码：91421000MA****WG7D，登记机关：荆州市市场监督管理局，最近更新登记日期为2021年8月19日。

2.总包单位基本情况

中建三局集团有限公司（以下简称“中建三局”），成立于2003年12月29日，注册资本为壹佰伍拾亿圆整，类型为有限责任制公司（非自然人投资或控股的法人独资），单位住所地为武汉市关山路552路号，法定代表人为陈卫国，经营范围为各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设，建筑工程、人防工程设计，商品混凝土的生产和批发；园林绿化工程；爆破作业设计施工（四级，有效期至2022年8月21日）；建筑材料（设备）销售；机电设备销售；污水处理设备销售及环保设备销售。营业期限为长期，统一社会信用代码：9142000075****137P，登记机关：湖北省市场监督

管理局，最近更新登记日期为2021年2月23日。

中建三局持有建筑业企业资质证书，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级，公路工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包特级（可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务），公路路基工程专业成本壹级，证书编号：D1****1823，最近更新日期为2021年3月22日，有效期至2022年12月31日，发证机关为中华人民共和国住房和城乡建设部。

中建三局持有安全生产许可证，许可范围：建筑施工，证书编号:（鄂）JZ安许证字【2005】****15，最近更新日期为2021年3月1日，发证机关为湖北省住房和城乡建设厅。

3.监理单位基本情况

湖北楚元工程建设咨询有限公司（以下简称“楚元公司”），成立于2001年9月28日，注册资本为壹仟万圆整，类型为有限责任制公司，单位住所地为湖北省荆州市北京西路307号，法定代表人为段秉宏，经营范围为房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。有效期至2024年3月4日，统一社会信用代码：9142100017****122H，登记机关：中华人民共和国住房和城乡建设部，最近更新登记日期为2019年3月4日。

（三）门窗、百叶、栏杆工程发包情况

2020 年 10 月 15 日,天恩润祥与盛世荆州签订《荆江之星一期门窗、百叶、栏杆供货及安装工程合同》，承接荆江之星建设项目 6#、9#、10#、23#、24#、27#、28#楼及幼儿园的门窗、百叶窗、阳台栏杆、空调板栏杆施工。入场前天恩润祥与总包单位中建三局签订了安全生产协议，天恩润祥门窗班组 2022 年 2 月 17 日进场施工。

（四）项目监管情况

中建·荆州之星二期乾盛地块项目建筑工程施工许可证是由荆州市住房和城乡建设局颁发，按“谁审批，谁负责”原则，该项目由荆州市住房和城乡建设局负责监管。荆州市建设工程质量安全监督站于 2 月 16 日和 3 月 23 日对中建·荆州之星二期乾盛地块项目现场进行安全检查，3 月 23 日检查发现临边防护安全方面存在风险隐患、高空作业人员未按规定系挂安全带等问题，下达了限期整改通知书，项目部上于 3 月 25 日整改完毕并向荆州市建设工程质量安全监督站上报了隐患整改情况。

（五）事故发生地点

事故地点位于荆江之星建设项目 24#楼采光井。事故发生时，24#楼建筑主体已基本完工，正在进行零星阳台栏杆及飘窗栏杆安装。

（六）事故当天天气情况

当天天气情况：雾转小雨，最高温度 15℃，最低气温 14℃，北风 4 级。

（七）死者基本情况

王*，男，26 岁，湖北省荆州市公安县人，身份证号 4210221996****6619，2022 年 3 月 15 日与天恩润祥签订劳务合同，2022 年 3 月 16 日加入门窗班组进场施工。



二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过及情况

2022 年 5 月 9 日 7 时，湖北天恩润祥建筑工程有限公司项目负责人常*龙安排高*和王*对 23 号楼部分阳台栏杆进行返工。7：30，高*和王*一起到 23 号楼 32 层作业。7：45 左右，王*一个人到 24 号楼采光井 19 层进行空调板栏杆安装作业，翻越 19 层采光井部位卫生间窗户时发生事

故。


（二）事故应急救援和善后处置情况

2022 年 5 月 9 日上午 8 时左右，外墙涂料施工人员徐*庆路过天井时发现王*躺在 24 号楼一层吊篮内，徐*庆随即报告给涂料负责人袁*涛，袁*涛与天恩润祥公司项目现场负责人常*龙一起赶到现场，常*龙安排车辆将王*送往三医进行抢救并报告项目部，8：30 项目部郑*到达现场向甲方和监理方进行报告。10：40 三医院宣布王*死亡。2022 年 5 月 11 日，事故单位与死者王*家属达成赔偿协议，未造成不良社会影响。

三、事故原因和性质认定

（一）直接原因

死者王*在荆江之星建设项目 24 号楼采光井 19 层空调板栏杆安装过程中违章作业，未正确使用安全带。

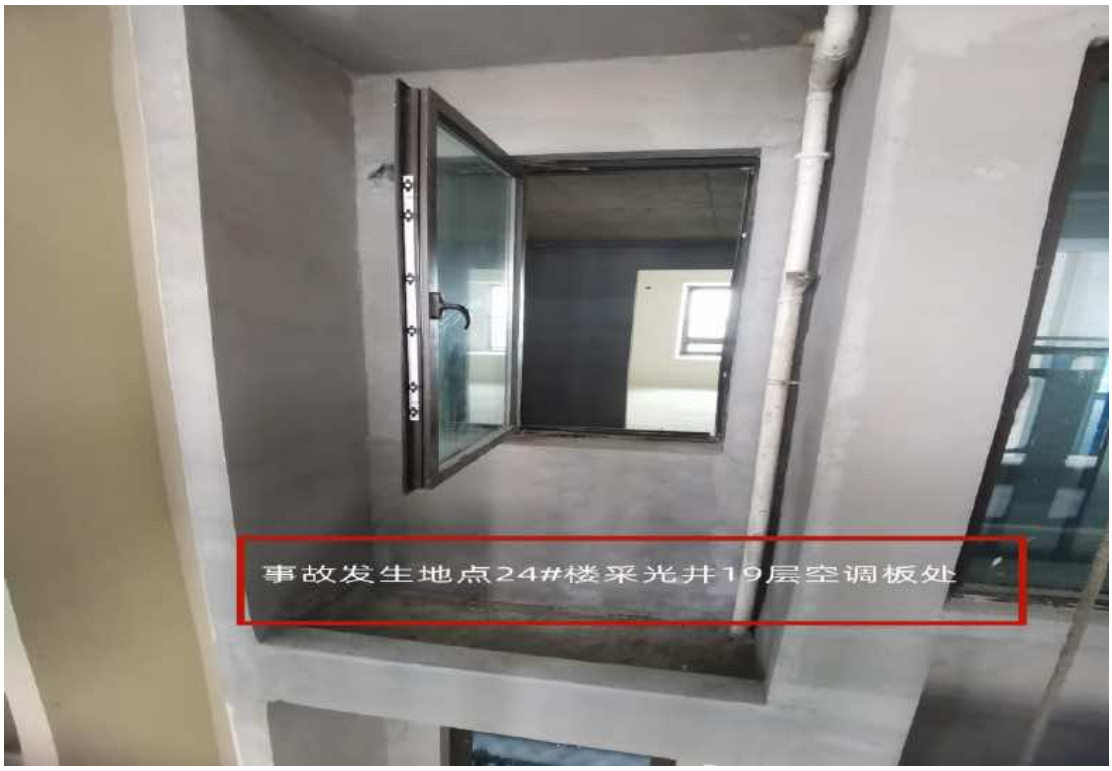

（二）间接原因

（1）湖北天恩润祥建筑工程有限公司安全生产主体责任不落实，现场施工管理混乱，未组织员工开展安全培训教育。

（2）中建三局盛世荆州房地产开发有限公司直接与天恩润祥签订门窗、栏杆、百叶窗供货及安装合同，造成项目安全生产管理脱节。

（3）湖北楚元工程建设咨询有限公司未严格履行监理职责，荆江之星建设项目天恩润祥施公司工现场项目负责人、安全管理人员同时离岗情况失察。

（三）事故性质

经事故调查认定，湖北天恩润祥建筑工程有限公司“5·9”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员

王*，男，天恩润祥聘用人员，对事故发生负有直接责任，在事故中死亡免于追究责任。

（二）建议追究事故单位责任人员

吕伟，男，天恩润祥项目经理，工作履职不到位，安全生产责任不落实。责成沙市区应急管理局依据《安全生产法》进行相关规定行政处罚。

常春龙，男，天恩润祥现场负责人，未组织开展安全生产教育培训，隐患排查治理工作不落实。建议天恩润祥按照公司相关规定进行处理。

赵海，男，天恩润祥专职安全员，未落实安全生产教育培训，隐患排查治理不到位。建议天恩润祥按照公司相关规定进行处理。

李国庆 ，男，楚元公司项目总监，履行项目监理职责不到位，对荆江之星建设项目天恩润祥施公司项目经理和安全员同时离岗情况失察。建议由楚元公司按照公司相关规定进行处理。

五、事故责任单位处理建议

湖北天恩润祥建筑工程有限公司安全生产主体责任不落实，未按规定组织安全生产教育和培训，生产安全事故隐患排查治理工作不落实，未及时消除事故隐患，导致生产安全事故发生。责成沙市区应急管理局依据《安全生产法》相关规定进行行政处罚。

六、事故防范及整改措施建议

针对事故暴露出来的问题，切实落实生产经营单位安全生产主体责任，有效防范类似事故再次发生，提出以下工作建议：

（一）湖北天恩润祥建筑工程有限公司应深刻吸取“5·9” 一般高处坠落事故教训，认真分析事故原因，举一反三，查漏补缺，加强项目管理人员到岗履职，组织有关人员全面开展生产安全隐患大排查，特别要督促涉及高处作业的相关人员做好防护措施，向其提供符合标准的劳动防护用品，监督作业人员正确使用。

（二）中建三局盛世荆州房地产开发有限公司为建设

单位，应依法履行安全生产职责，督促参建各方完善安全施工责任体系和制度，实现建筑施工安全标准化。

（三）湖北楚元工程建设咨询有限公司要加强对专业分包单位主要管理人员到岗履职的管理，强化对各专业分包项目安全方案核查和施工现场巡查工作，落实项目监理职责。

（四）沙市区人民政府朝阳路街道办事处要认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，坚持“三管三必须”的工作要求，落实属地安全生产责任。

湖北天恩润祥建筑工程有限公司

“5·9”一般高处坠落事故调查组

2022 年 8 月 1 日
