承德岗子绵阳某工程有限公司
“5·30”一般起重伤害事故调查报告

承德县政府事故调查组

编制日期：2026年6月9日

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
（二）项目概况.....4
（三）事故发生和关联单位安全管理情况.....5
（四）事故发生经过.....7
（五）事故现场情况.....8
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....12
二、事故应急处置及评估情况.....13
（一）事故信息接报及响应情况.....13
（二）事故现场应急处置情况.....13
（三）医疗救治和善后情况.....14
（四）事故应急处置评估.....14
三、事故原因.....14
（一）事故直接原因.....14
（二）间接原因.....14
四、有关责任单位存在的主要问题.....15
五、对相关责任人员和责任单位的处理建议.....16
（一）建议免予追究责任人员（1人）.....16
（二）对公职人员的处理建议（4人）.....16

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（3人）.....17
（四）对事故有关责任单位的行政处罚建议.....18
（五）其他处理建议.....19
六、事故主要教训.....19
七、事故整改和防范措施.....20
（一）岗子乡政府应坚守保护人民群众生命安全的“红线”.....20
（二）县发展和改革局要加大行业监管力度.....20
（三）举一反三夯实生产经营单位基础管理.....20

承德岗子绵阳某工程有限公司
“5·30”一般起重伤害事故调查报告

2025年5月30日10时30分许，绵阳某工程有限公司在承德县岗子乡岗子村西沟南侧山顶集线塔上私自安装监控设备过程中发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失140万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定，2025年5月30日，承德县人民政府成立了事故调查组。调查组由县发展和改革局牵头，县公安局、县总工会、县应急管理局等有关单位人员组成。承德县纪委监委同步成立追责问责组，依规依纪依法对有关责任单位和责任人开展调查审查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查问询、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，对有关责任单位和责任人提出了处理建议，并提出了事故防范措施和建议。

经调查认定，绵阳某工程有限公司“5·30”一般起重伤害事故，是一起因绵阳某工程有限公司未执行停工令，私自开展与主工程无关的其他起重吊升作业，作业人员违章作业，造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

（1）绵阳某工程有限公司（以下简称绵阳某公司）

2014年8月13日成立，位于四川省绵阳市江油市城区太白中路金鹏现代城1栋4楼17-18号，统一社会信用代码**********，法定代表人刘某某，注册资本500万元人民币，经营范围为建设工程施工等。具有四川省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，编号为D25118****，有效期至2030年4月30日。资质类别及等级为市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级等。具有绵阳市住房和城乡建设委员会颁发《建筑业企业资质证书》，编号为D351Z6****，有效期至2026年10月29日。资质类别及等级为施工劳务不分等级。具有四川省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号为（川）JZ安许证字〔2023〕01****，有效期为2023年11月7日至2026年11月7日，许可范围为建筑施工。

2.事故相关单位概况

（1）承德某有限公司（以下简称承德某公司）

2023年8月29日成立，位于河北省承德市承德县下板城镇万荣建材物流中心A区四层C418-01，统一社会信用代码**********，法定代表人周某，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本50万元人民币，经营范围为发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项

目：热力生产和供应等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）福建某工程咨询有限公司（以下简称福建某公司）

2012 年 8 月 22 日成立，位于福建省福州市晋安区新店镇坂中路 6 号泰禾城市广场（二期）5#、5a#楼 4 层 21-23、25-27，统一社会信用代码**********；法定代表人周某某，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本 2010 万元人民币，经营范围为一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。许可项目：建设工程监理等。《工程监理资质证书》编号 B23502****，有效期至 2028 年 11 月 2 日。

（3）中国某局工程有限责任公司（以下简称某局公司）

2002 年 12 月 31 日成立，注册地址为湖北省武汉市江夏区纸坊街北华街东 14 号，统一社会信用代码为**********，法定代表人孙某某，企业类型为其他有限责任公司；注册资本 135460.992908 万元人民币，企业的经营范围为许可项目：建设工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。《建筑业企业资质证书》编号为 D14200****，有效期至 2028 年 12 月 22 日；建筑工程施工总承包特级；电力工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级：输变电工程专业承包壹级等资质，发证机关为中华人民共和国住房和城乡建设部。《承装（修、试）电力设施许可证》编号

为 5-4-01218-****；许可类别和等级：承装类一级、承修类一级、承试类一级；有效期至 2026 年 7 月 1 日；许可机关为国家能源局。《安全生产许可证》编号：（鄂）JZ 安许证字〔2005〕00****；许可范围建筑施工；有效期至 2025 年 10 月 21 日；发证机关为湖北省住房和城乡建设厅。

（二）项目概况

1.承德某光伏储能一体化项目

该项目占地约 8244 亩，年设计发电量约 2.65 亿 MWh，总投资 71250 万元，由承德某公司（投资建设，于 2023 年 8 月 30 日在承德县行政审批局备案（备案文号：承县审批投资备字〔2023〕92 号）。该项目于 2025 年 2 月 10 日开工，项目监理单位福建某公司于 2024 年 10 月 17 日中标光伏储能项目标段包 1，于 2024 年 10 月 25 日与承德某公司签订光伏储能项目施工监理合同，合同金额为 1056000 元。总包单位某局公司于 2024 年 10 月 18 日中标光伏储能项目 PC 工程标段包 1，于 2024 年 11 月 9 日与承德某公司签订了光伏储能项目合同，合同金额为 294676606 元，某局公司设立了光伏储能项目部负责项目管理。涉事的绵阳某公司是该项目的劳务分包单位，于 2024 年 11 月 20 日，与某局公司签订光伏储能项目劳务分包合同，工程暂定总价为 22449488.99 元，负责直埋电缆光缆施工等。

2.涉事的监控设备安装项目

经查，涉事的监控设备安装项目不属于光伏储能项目工程施

工范围内容，是绵阳某公司为提前占领国家储备林建设及森林质量提升项目[1]市场，作为在向投资人推广时远程观看现场而采取的措施，事故发生在光伏储能项目工程整体暂停施工期间[2]，绵阳某公司利用劳务分包单位身份，未经允许私自在路集线塔上安装监控设备。

（三）事故发生和关联单位安全管理情况

（1）绵阳某公司

该公司中标后组建了分包单位项目部，由公司法定代表人刘某某全面管理负责，项目施工负责人庞某某，专职安全管理人员刘某、任某，兼职安全管理人员王某。该公司建立了安全生产责任制，制定了相关规章制度等，工人上岗前完成了安全教育培训，在日常施工时，由项目负责人实施安全检查工作。涉事监控设备安装项目是刘某某私下直接安排刘某进行的。

（2）福建某公司

签订监理合同后，该公司成立了监理项目组，其监理范围为光伏场区、集电线路、220kV 升压站内扩建全范围内，从施工准备开始到土建、安装、调试至工程所有项目竣工验收合格之日的全过程监理。2025 年 4 月 2 日项目总监理工程师由卢某某变更

---

[1] 国家林业和草原局关于印发《“十四五”国家储备林建设实施方案》的通知（林工发〔2023〕17 号）：党中央、国务院高度重视国家储备林建设工作，党的十八大以来，国家安排专项投资启动实施了国家储备林建设工程，在国家“十三五”规划纲要和《生态文明体制改革总体方案》中对国家储备林建设做出了顶层设计和安排，国家储备林建设取得了明显成效，积累了经验。当前，我国木材资源短缺、质量不高、结构性失衡等问题仍很突出，木材安全形势依然严峻。为进一步推动“十四五”国家储备林建设高质量发展，根据《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》和《国家储备林建设规划（2018-2035 年）》等，制定本方案……

[2] 《工程暂停令》编号为 HNCDX-JDJL-GCZT-AQ：由于承德某光伏储能一体化项目计划于 2025 年 05 月 29 日组织进行并网送电。为避免现场混乱，现通知你部于 2025 年 05 月 29 日 08 时至 2025 年 05 月 31 日 18 时，停止本工程项目全部施工，具体复工时间另行通知。

为秦某某，监理工程师为胡某某、专业监理工程师为闫某某等四人。在项目服务履行期间，监理工程师每日对施工现场进行安全巡查工作，对巡查过程中发现的问题与隐患进行记录。总监理工程师每周定期组织开展监理例会，通报施工过程中排查出的各类安全隐患问题以及违章作业行为。根据工程阶段的具体要求，总监理工程师向施工单位下达了书面形式的工程暂停令，期间和建设单位、总包单位一起进行安全检查。

（3）某局公司

该公司中标后组建光伏储能项目部，项目部经理师某负责项目全面管理，安全总监宋某某负责安全方面专业管理，现场生产经理为程某某，执行经理杜某负责按师某授权实施其不在项目期间的现场管理。该公司制定了安全生产责任制、管理制度和安全操作规程等安全管理制度体系，明确了各部门、各岗位的安全职责与工作要求，对各分包单位进行了相关教育培训和日常安全检查工作。在并网前已经将书面工程停工令发放到绵阳某公司，并要求其在停工期间停止施工作业行为。

事故发生前（5 月 20 日）项目经理师某外地出差，委托杜某负责项目管理工作，生产经理程某某负责现场管理。5 月 28 日、29 日，程某某带领项目部人员对停工现场进行了巡查，5 月 30 日上午杜某带领项目部人员到升压站参加并网测试仪式和专题培训活动，程某某与监理人员按日常巡检计划路线，从升压站始端塔 QN1 开始至 QN38 铁塔顺序进行巡查。主要检查铁塔及线

路架空廊道范围内标识、风筝线、树木枝条等影响送电安全情况。当巡检至QN9还未到达QN13塔基处时事故发生。

（四）事故发生经过

2025年5月28日，监理单位福建某公司组织各相关单位人员在升压站会议室召开了并网测试启动会，并下发了书面工程暂停令（计划5月30日进行HN回路并网测试，5月31日进行QN回路并网测试），要求光伏储能项目包括升压站、集电线路（包含QN13号集线塔）、光伏场区，于5月29日至5月31日期间全面停止施工进行并网测试。同日，根据监理单位提出的停工令，光伏储能项目部对下属各分包公司下发书面工程停工令，绵阳某公司由现场负责人庞某某签收。

2025年5月29日下午，绵阳某公司刘某某私下安排刘某准备在QN13号集线塔上安装监控设备，5月30日7时许，刘某抽调罗某某、熊某某、唐某、李某某、谭某某、刘某、邓某、熊某某（死者）8名工人并进行工作分工，刘某负责组织施工和现场安全监管，罗某某负责地面的角磨牵引机操作，刘某、唐某、邓某3人负责塔身上监控设备的安装和监控设备箱体地线端子的压接工作，熊某某、李某某、谭某某、熊某某为地面普工，负责地面物料搬运等辅助工作。8时许，9人到达安装作业现场，搬运施工用具做准备工作。9时45分许，唐某、刘某2人先后攀爬塔身至监控设备安装作业处(约塔身18m处)等待吊升压线机，之后压线机的液压泵站被搬运至起吊点，熊某某、谭某某、邓某

离开现场，刘某安排完后出去打电话。10 时 5 分许，熊某某根据经验使用牵引绳本体捆绑液压泵站进行吊升作业，并将牵引绳末端当作溜绳[3]使用。10 时 15 分许，罗某某启动绞磨牵引机，开始吊升液压泵站，李某某负责将绞磨牵引机卷筒放出的余绳盘起配合吊升作业，熊某某在塔基北侧通过拉拽牵引绳末端的方式调整液压泵站的吊升角度，防止在吊升过程中与塔身发生摩擦和碰撞。受牵引绳末端长度所限，随着液压泵站逐渐升高，熊某某也随之向集线塔方向靠拢。10 时 30 分许，液压泵站在吊升高度约 10m 左右时突然坠落，此时熊某某距离塔体约 0.8m，掉落的液压泵站砸到熊某某头部后滚向塔体西北侧灌木丛内，熊某某倒地。刘某立即组织现场工友合力将其抬运至山脚下，等待医疗救护。

（五）事故现场情况

1.现场勘查情况

事故发生于承德县岗子满族乡岗子村西沟天工矿业南侧山顶，编号为 QN13 集线塔的塔体北侧约 0.8 米处（图 1）。经现场勘查，塔底绞磨牵引机未见明显位移和变形，牵引绳未见断裂痕迹，定滑轮挂钩与绳索连接良好，轮轴未见脱落（图 2）。液压泵站滚落至集线塔北侧草丛，油箱脱落，支架扭曲变形，底轮支板损伤开焊（图 3）。

[3] 溜绳：在吊升的结构物上拴绳，由下面的人拉住，防止结构物在吊升过程中随意摇摆。



图 1 事故发生位置

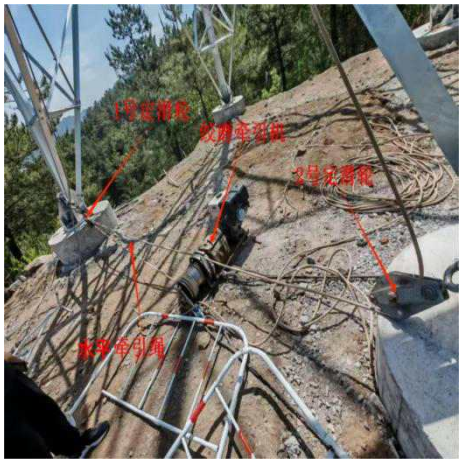


图 2 吊升机械装置



图 3 掉落的液压泵站

2. 监控设备情况

现场监控设备由摄像头、配电箱、太阳能板及信号传输装置组成，该设备为绵阳某公司购买，准备作为国家储备林建设及森林质量提升项目开发过程中商务洽谈和环境观察的可视化工具。5 月 30 日，绵阳某公司负责人刘某某趁光伏储能项目电网 HN 回路并网测试整体停工间隙，在未通知监理单位和总包单位情况下，私自安排安全员刘某组织人员在 QN13 号集线塔（该集线塔所在

的 QN 回路未送电）上安装该监控设备（图 4）。



图 4 监控设备

3.监控设备接地工艺情况

因集线塔位于野外山顶和线路本身高电压特性，为防止发生雷击等过压情况导致设备损坏，监控设备安装在集线塔上时，需要在其配电箱和集线塔之间设置专用接地线[4][5]，绵阳某公司利用前期集线塔施工剩余光纤复合地线材料作为配电箱接地线（图 5）。具体施工工艺为：将接地线穿进接线端子（俗称线鼻子）中，放到液压钳中心孔内，通过液压泵站提供的高压将接线端子与接地线压接紧密，再用接线端子作为连接机构将配电箱与集线塔的地线扁铁用螺栓连接紧固，形成“配电箱外壳→接地线→铁塔结构体”的接地通道（图 6）。

[4]《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB/T50169-2016 第 3.0.4 条规定：电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置必须可靠接地。

[5]《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065-2011）第 3.2.1 条第 13 款规定：装在配电线路杆塔上的开关设备、电容器等电气装置，需要设置接地。



图 5 现场遗留的接地线



图 6 模拟监控设备接地形态

4.集线塔建设情况

光伏储能项目中编号为 QN13 集线塔上架设有四回集电线路，标称电压 35 千伏，塔高 24 米，坐标 X：585010.7040，Y:4567965.2930，Z：549.276，为一级升压 35 千伏集线塔，集线塔顶端安装有两根光纤复合地线作为防雷接地线路。至事故发生时，QN13 集线塔与上游升压站和下游光伏厂区的线路已连通完成，处于待通电验收阶段（图 7）。



图 7 QN13 集线塔（塔顶）

5.导线压接机情况

导线压接机型号为SY-BJQ-1250/80-B，由工作压力为80Mpa、功率4千瓦、重约65公斤的液压泵站和液压钳两部分组成，液压泵站动力由自带的汽油马达提供，液压管长度约4米。该压接机为绵阳某公司所有，平时用于集线塔线路接线端子的压接，事发时作为监控设备配电箱地线接线端子压接使用。由于安装监控设备配电箱的高度约为18米，液压泵站的液压管长度不满足现场使用要求，现场操作工人决定使用起重吊升机械将压接机吊升至监控设备配电箱高度附近进行下一步作业。

6.起重吊升机械装置情况

起重吊升机械装置由1台型号为FM-IA、额定功率为5.5千瓦、额定牵引力为49千牛的机动绞磨牵引机（燃料为汽油）、φ14毫米高模聚乙烯纤维绳、3个2吨定滑轮现场组装而成。绞磨牵引机为吊升机械提供吊升动力，高模聚乙烯纤维绳作为吊运物品牵引绳，3个定滑轮组将绞磨牵引机卷扬力矩变为垂直力矩，并作用在牵引绳上用于物品吊运。5月30日上午作业人员熊某某在吊升导线压接机的组件液压泵站时，利用牵引绳作为吊索具捆绑在液压泵站上进行吊升作业。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。

事故造成1人死亡，死者姓名为熊某某，男，56岁，绵阳某公司员工，住址四川省蓬溪县蓬南镇芝家村。

2.直接经济损失情况。

包含丧葬抚恤费、赔偿金以及抢救费等直接经济损失约140万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年5月30日10时40分许现场安全管理负责人刘某通过电话向庞某某汇报，随即庞某某安排王某赶往现场，11时5分许王某向宋某某报告有人员受伤，宋某某告知王某稳定现场工人，观察伤员情况及时送医，后经镇卫生院医生和承德康源医院分别判定死亡后，王某未再向宋某某报告。12时50分，王某向刘某某汇报人员死亡，之后刘某某一直设法联系和安排死者在四川的家属赶赴承德。14时30分许，刘某某电话向项目部杜某汇报人员死亡，14时40分许杜某向岗子乡人民政府副乡长刘某某上报事故。15时15分，岗子乡政府乡长陈某某口头向县政府主管县长汇报。15时30分，岗子乡政府以书面形式向县应急管理局、县政府、县发展和改革局报告，15时49分县应急管理局电话上报至承德市应急管理局。绵阳某公司法定代表人刘某某迟报事故。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，刘某于10时38分许电话通知庞某某，随即庞某某电话安排兼职安全员王某组织救援，王某到达后于10时50分许拨打120急救电话，承德县岗子乡卫生院接到出诊求助电话后，于11时10分许到达现场，对伤者进行诊查，经诊断伤者无

呼吸、无脉搏、无心跳。王某请示刘某某后，开车将熊某某送往承德康源医院，协助开展善后工作。

（三）医疗救治和善后情况

2025 年 5 月 30 日 12 时 40 分许到达承德康源医院后，经医生诊断确认伤者死亡。2025 年 5 月 31 日，绵阳某公司与死者家属就善后赔偿事宜达成一致，死者已在老家安葬，善后工作完毕。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场安全负责人刘某在报告的同时，及时联系 120 医护，并组织现场人员将伤者抬至山下，120 医护随后赶到，现场处置和人员救治有序，未发生次生灾害，应急处置措施得当。

三、事故原因

（一）事故直接原因

作业人员熊某某在起重吊升过程中违规使用吊升索具，为“图省事”采用牵引绳捆绑被吊物的方式进行起重吊升作业，并将牵引绳末端当作溜绳使用，且溜绳长度不足，导致作业人员熊某某逐步靠近集线塔，到达被吊物下方，又因系挂重物方式不正确，导致重物坠落，砸中下方人员熊某春。

（二）间接原因

绵阳某公司安全生产主体责任落实不到位，一是未服从监理和总承包公司下发的工程暂停令，未经允许私自组织工人进行与主工程无关的起重吊升作业[6]；二是未对现场施工人员进行安全

[6] 《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第四款之规定：分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

交底，未组织技术人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由双方签字确认[7]。三是未向作业人员书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害[8]；作业活动前未进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认，未及时排除风险[9]，不满足安全生产条件[10]。四是安全生产责任制落实不到位，从主要负责人[11]、项目负责人[12][13]到安全管理人员[14]把关不严，未能排查出并及时消除造成人员死亡的事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）承德县发展和改革局。未认真履行光伏发电行业安全生产指导职责，对相关单位的安全生产工作指导和监督不足，对光伏发电项目安全风险防范措施落实情况指导不到位。

（二）岗子满族乡党委和政府。履行属地监管责任不到位，

---

[7]《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[8]《建设工程安全生产管理条例》第三十二条第一款：施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

[9]《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十三条：生产经营单位的班组开展生产经营活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认，并及时排除新产生的风险；生产经营活动结束后，应当对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[12] 根据《绵阳某工程有限公司公司安全生产责任制》中对项目经理庞某某的职责规定，庞某某肩负对其负责的工程项目安全生产工作负全面责任等共计 12 项安全生产职责。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

督促相关单位落实主体责任力度不够，日常安全检查不到位。

五、对相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员（1人）

1.熊某某，绵阳某公司施工人员。在压线机吊升过程中违规作业，吊物捆绑不牢且站在吊物下方，捆绑液压泵站的绳扣不牢导致滑脱坠落，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对公职人员的处理建议（4人）

1.张某某，中共党员，承德县发展和改革局副局长，分管资源节约和环境保护股等股室，对分管领域安全生产工作重视不够，督促监管不到位，对事故的发生负有领导责任，建议给予批评教育。

2.李某某，群众，承德县发展和改革局资源节约和环境保护股负责人，负责新能源行业日常监管工作。未严格督促相关单位落实停工期间作业行为，对事故的发生负有监管责任，建议给予诫勉。

3.刘某某，群众，承德县岗子满族乡政府副乡长，分管安全生产工作。对属地安全生产工作重视不足，督促指导属地安全生产监管工作不到位，对事故的发生负有领导责任，建议给予批评教育。

4.劳某某，群众，承德县岗子满族乡安全发展办负责人，负责属地安全生产监督管理工作。履行属地安全生产管理职责不到

位，停工期间安全检查不到位，对事故的发生负有监管责任，建议给予诫勉。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（3人）

1.刘某，绵阳某公司光伏储能项目专职安全管理人员，负责当日起重作业施工现场安全生产管理工作。安全管理不到位，对起重吊升作业过程监管缺失，未及时制止和纠正违规作业行为，未能及时排查出造成人员死亡的生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项和第六项规定，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[15]之规定，建议由承德县发展和改革局提请发证机关暂停其与安全生产有关的资格、由承德县应急管理局对其处以2024年度年收入20%的行政处罚。

2.庞某某，绵阳某公司光伏储能项目负责人。履职不到位未执行工程暂停令，未制止不在分包范围内的作业活动，履行职责范围内安全生产工作责任不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条规定，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由承德县发展和改革局提请发证机关暂停其项目负责人资格，并由承德县应急管理局对其处以2024年度年收入20%的行政处罚。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

3.刘某某，绵阳某公司法定代表人。未正确履行生产经营单位主要负责人安全生产职责，未严格落实监理单位下发的工程暂停令，在作业开展前和作业过程中也未落实针对起重作业的风险辨识管控和隐患排查治理的双重预防工作机制，未及时消除造成人员死亡的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项规定，对事故的发生负有重要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[16]之规定、建议由承德县应急管理局对其处以2024年度年收入40%的行政处罚；事故发生后，未在规定时间内上报事故[17]，迟报该起事故，对事故迟报负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款[18]之规定，建议由承德县应急管理局对其处以2024年度年收入60%的行政处罚。

（四）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.绵阳某公司。违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第四款、《建设工程安全生产管理条例》第二十七条、《建设工程安全生产管理条例》第三十二条第一款、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十三条、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十八条第一项和第四项、《中华人民共

[16]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。

[18]《中华人民共和国安全生产法》 第一百一十条第二款：生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

和国安全生产法》第四条第一款；依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[19]建议由承德县应急管理局对其进行行政处罚。

（五）其他处理建议

建议承德县发展和改革局、承德县岗子满族乡党委和政府分别向承德县委、县政府做出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）对起重作业等高风险作业行为缺乏警惕意识。施工单位没有深刻认识起重作业的高风险性，相关的培训不深入，作业人员也不具备相关的安全作业能力和风险辨识能力，缺乏必要的安全意识和安全技能。

（二）起重吊具索具安全管理缺失。没有指派专人对吊具、索具的外观、性能及连接情况进行检查，确保其处于完好状态。吊装作业前，也没有根据被吊物的重量、形状、重心位置等合理选择吊具和吊点，并确保连接牢固可靠。

（三）作业现场安全监护不到位。高风险作业时，安全管理人员安全管理能力不足，没有尽职尽责地划定吊装作业警戒区域，设置警示标志；没有做好作业现场的安全风险辨识分析；没有及时发现并制止违章作业和违反操作规程的作业行为。

（四）未落实安全检查制度。未在高风险作业前、作业过程中进行细致现场安全检查，也未进行技术交底。

---

[19]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

七、事故整合防范措施

（一）岗子乡应坚守保护人民群众生命安全的“红线”

岗子乡党委和政府要牢固树立科学发展、安全发展的理念，进一步牢固树立安全生产“底线思维”，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条不可逾越的红线。进一步明确和落实各乡内各股、站、市安全监管职责，做到安全监管责任的“无缝隙、全覆盖”。建立健全安全生产隐患排查长效机制。

（二）县发展和改革局要加大行业监管力度

县发展和改革局应深刻吸取此次事故的教训，进一步明确和落实局内各股室的安全生产职责，充分认识到电力建设工程行业的高风险性，特别要加强对工程项目施工过程的监管，杜绝麻痹思想及侥幸心理。督促建设单位落实第一责任人责任，加强对工程项目的全过程监管，常态化开展电力施工领域安全监督检查，严厉打击施工作业人员未经培训上岗、违章作业、违章指挥、强令冒险作业等违法行为。及时发现和解决工作不深入、打击不严厉、治理不彻底等突出问题，完善安全生产长效机制，确保人民群众生命和财产安全。要督促监理单位对项目安全施工进行监督检查，发现安全隐患；督促施工单位遵守有关法律法规要求和履行合同义务，完善安全生产管理制度，对无视安全生产法律法规、拒不整改隐患、藐视监管等违法违规行为要依法严厉查处，防范类似事故的再次发生。

（三）举一反三夯实生产经营单位基础管理

建设单位要依法依规开展电力工程建设，加强对各参建单位的协调监督管理，定期检查现场安全文明施工情况，压实安全责任，确保安全措施有效落实。作为项目主导方，要加强招投标管理，严查非法转包和违法分包行为，加强安全监督与应急管理，定期组织安全生产联合检查，重点排查施工现场临时用电、高空作业及起重吊升等高风险作业，严厉打击违规作业、不听从监理单位指挥的行为。

监理单位要按照法律法规和工程建设强制性标准及监理合同实施工程监理，严格审查各项施工方案，对不符合安全规定的必须要求修改并重新报审。要加大施工现场巡查力度，定期开展施工现场安全生产监督检查工作，对施工现场作业人员习惯性违章行为要立即制止。要核查施工单位对监理指令的执行情况，拒不执行的应向建设单位和行业主管部门报告。要强化施工机械设备等全流程专项验收工作，验收不合格的不得进入下一道工序。

施工单位应建立健全本单位安全生产责任制，完善本单位及项目安全生产规章制度和操作规程，对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核；组织制定并实施安全生产教育和培训计划，培训考核不合格人员应禁止上岗作业。要从严处理不听从建设单位和监理单位指令的行为，加强对违规作业行为监督检查，对高风险作业制定专项方案并进行安全交底。
